


Id	Opgave	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgave	Kvt 3 2023			
							jul	aug	sep	okt
1		BDK Projektledelse	212 dage	on 16-08-23	to 06-06-24					
14		BDK SCM Bygherreleverancer	86 dage	on 18-10-23	on 14-02-24					
20		BDK CSM	229 dage	ti 23-01-24	ma 09-12-24					
39		BDK TPE	10 dage	on 03-01-24	ti 16-01-24					
41		Rådgiver Ydelser	434 dage	on 16-08-23	ma 14-04-25					
64		Total Spærring Ab-Hj	50 dage	sø 28-07-24	ma 07-10-24					
65		Spærring Start	0 dage	sø 28-07-24	sø 28-07-24					
66		Spærring Slut	0 dage	ma 07-10-24	ma 07-10-24					
67		Entreprenør Perron	88 dage	to 06-06-24	ma 07-10-24					
68		Mobilisering	25 dage	to 06-06-24	on 10-07-24	59				
69		Indretning af byggeplads	15 dage	to 11-07-24	on 31-07-24	68				
70		Udførelse Perron	43 dage	to 01-08-24	ma 30-09-24	69				
71		Restarbejder og demobilisering	5 dage	ti 01-10-24	ma 07-10-24	70				
72		Entreprenør Spor	5 dage	ti 01-10-24	ma 07-10-24					

Projekt: NPTS0001 Perronhævn Dato: to 05-10-23	Opgave		Inaktiv oversigt		Eksterne opgaver	
	Opdeling		Manuel opgave		Ekstern milepæl	
	Milepæl		Kun varighed		Deadline	
	Hovedopgave		Manuel oversigtsopløftning		Fremdrift	
	Projektoversigt		Manuel oversigt		Manuel status	
	Inaktiv opgave		Kun start			
	Inaktiv milepæl		Kun slutdato			

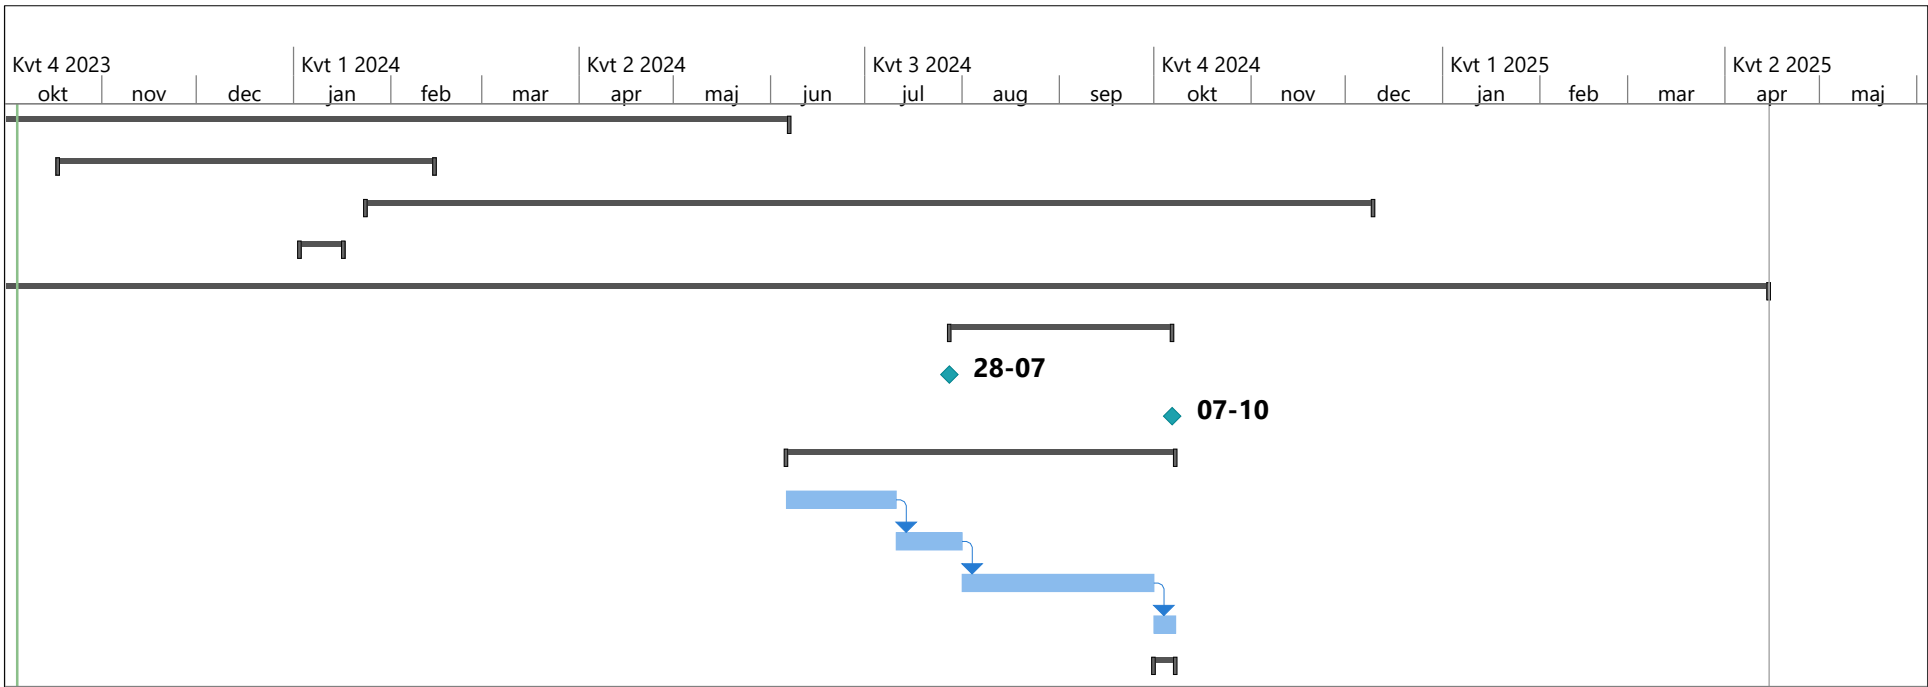

Projekt: NPTS0001 Perronhævn Dato: to 05-10-23	Opgave		Inaktiv oversigt		Eksterne opgaver	
	Opdeling		Manuel opgave		Ekstern milepæl	
	Milepæl		Kun varighed		Deadline	
	Hovedopgave		Manuel oversigtsopløftning		Fremdrift	
	Projektoversigt		Manuel oversigt		Manuel status	
	Inaktiv opgave		Kun start			
	Inaktiv milepæl		Kun slutdato			
